

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

**Betreft: Monitoring relanceplan Vlaamse Veerkracht: zevende meting,
31 december 2024**

Samenvatting: deze mededeling aan de Vlaamse Regering geeft een overzicht van de voortgang van de uitvoering van de projecten van het relanceplan Vlaamse Veerkracht op het zevende meetmoment van 31 december 2024.

1. INLEIDING

Deze mededeling bevat een overzicht van de voortgang van de uitvoering van de projecten van het relanceplan Vlaamse Veerkracht op het meetmoment 31 december 2024.


Het Vlaamse Relanceplan werd eerder al drie keer gemonitord in 2021 (maart, september en december), twee keer in 2022 (juni en december), en éénmaal in 2023 (december).

Dit is de eerste meting sinds de nieuwe regeerperiode. Vandaar wordt ervoor geopteerd enkel nog de 159 projecten gefinancierd via de relanceprovisie van 4,3 miljard euro op te nemen in de monitoring, en niet langer deze op reguliere middelen (VV159-VV180).

2. RELANCEPLAN VLAAMSE VEERKRACHT

Het [relanceplan](#) werd in de steigers gezet als antwoord op de COVID-19 crisis, op basis van de aanbevelingen van het Maatschappelijk en het Economisch Relancecomité. Het werd voorgesteld bij de Septemberverklaring in 2020 en investeert sindsdien 4,3 miljard euro bijkomend in onze economie en maatschappij, met 7 speerpunten:

1. Economie en samenleving verduurzamen;
2. Investeren in infrastructuur;
3. Vlaanderen digitaal transformeren;
4. Investeren in mensen en talenten;
5. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken;
6. De coronacrisis beheren en Brexit;
7. De overheid efficiënter maken.

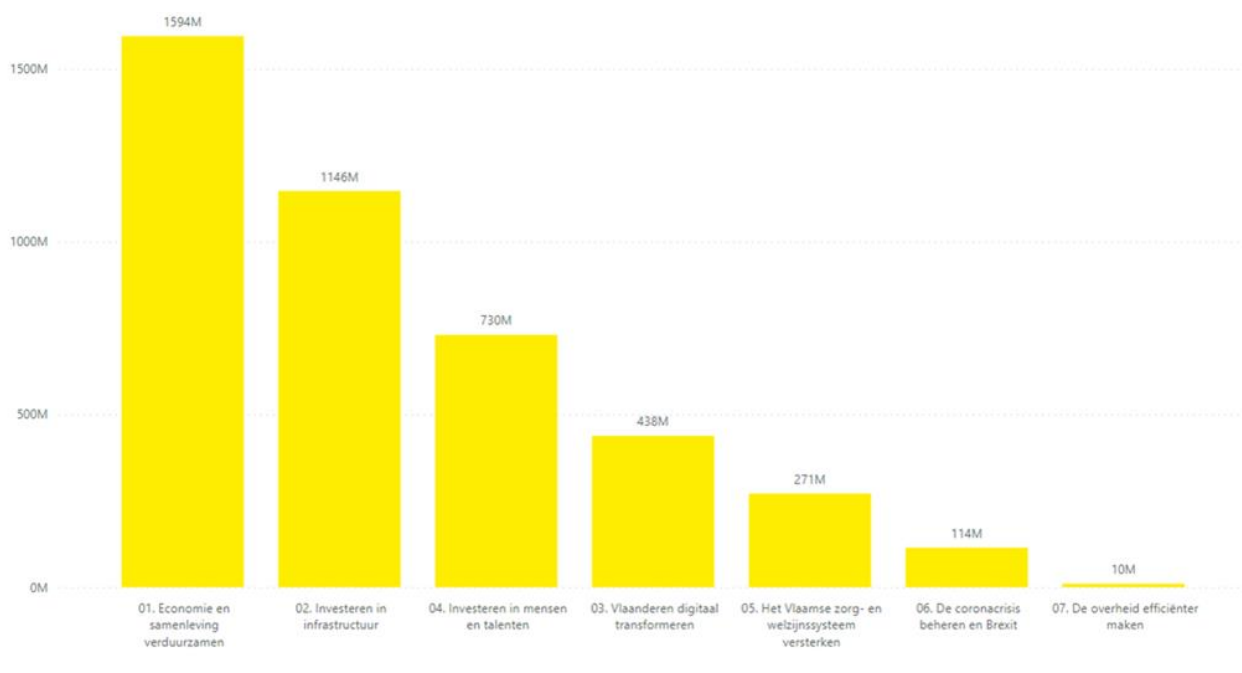

Verdeling relancebudget per speerpunt (cijfers in miljoenen)

159 projecten worden gefinancierd door de 4.3 miljard euro aan eenmalige relancemiddelen. Voor 22 projecten maakte de vorige Vlaamse Regering herstellmiddelen via bestaande en extra reguliere financiering vrij. Enkel de 159 projecten op eenmalige relancemiddelen zijn in de nieuwe meting opgenomen.


3. VOORTGANG RELANCEPROJECTEN 31 DECEMBER 2024

Vlaamse Veerkracht zit op schema; een steeds groter aandeel van de projecten is ook gerealiseerd.

Bij deze zevende meting, de eerste van deze regeerperiode, kunnen we vaststellen dat de uitvoering van het plan Vlaamse Veerkracht nog steeds op schema verloopt. In vergelijking met de vorige meting van 31/12/2023 werd opnieuw een mooie vooruitgang geboekt.


- Van de 159 projecten in deze monitoring zijn er 53 gerealiseerd. Dat is exact één derde van projecten, en een stijging met 20 gerealiseerde projecten ten opzichte van de vorige meting.
- 58% van de projecten (92) zijn in uitvoering volgens schema. Slechts 3 projecten werden stopgezet (2 daarvan waren reeds bij vorige meting stopgezet).
- Voor 2 projecten is er aandacht nodig, en voor 9 projecten is er een actie vereist. In de factsheet wordt toegelicht over welke projecten het gaat, en welke acties ondertussen reeds ondernomen zijn.
- De vastleggingskredieten zijn in 2024 weinig gewijzigd tot 4,164 miljard euro ofwel 96,78% van de initieel voorziene relancemiddelen.
- De vereffeningskredieten kenden een opnieuw substantiële stijging met 890 miljoen euro: van 2,16 miljard euro eind 2023 naar 3,05 miljard euro eind 2024, ofwel 70,89% van de initieel voorziene relancemiddelen.

Hieronder vindt men de projectstatus van de 159 relanceprojecten op relancemiddelen sinds de start van Vlaamse Veerkracht, met het meetmoment 31 december 2024 uiterst rechts in de grafiek.

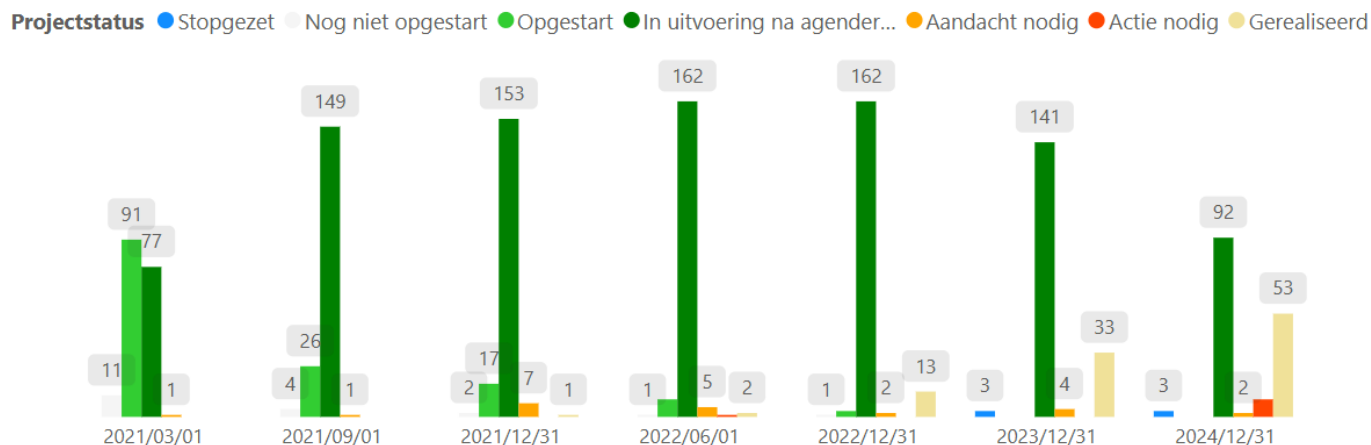


De grafieken hieronder geven de evolutie weer van de vastleggingskredieten (VAK) en de vereffeningskredieten (VEK) als aandeel van de totale beleidsruimte van 4,3 miljard euro.

Uitvoering VAK %

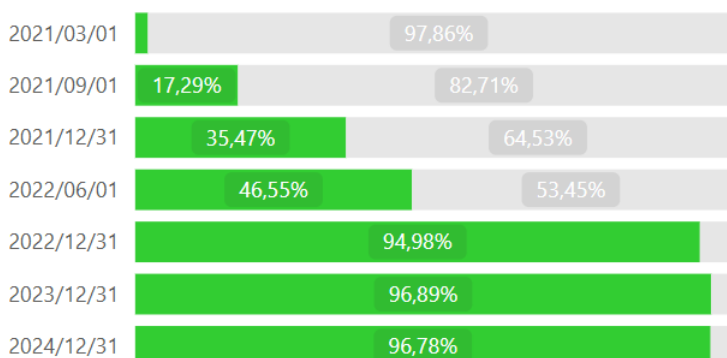

Uitvoering VEK %

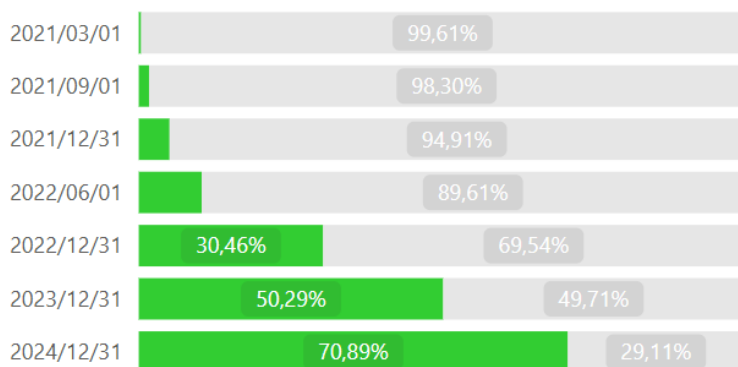

Detail op project- en speerpuntniveau ook beschikbaar

De factsheet als bijlage geeft op speerpunt- en projectniveau een overzicht van de voortgang. Er werd voor gekozen om vanaf deze meting dit overzicht een stuk compacter te maken, zoals ook aangekondigd bij vorige meting. De dataverzameling op het individuele projectniveau is niet gewijzigd in vergelijking met de vorige meting. De projectfiches van de 159 projecten kregen in deze monitoring een update, die men kan nalezen in het integrale voortgangsrapport.

Alle documenten zijn opnieuw ontsloten op www.vlaanderen.be/vlaamseveerkracht, en het [dashboard](#) Vlaamse Veerkracht kreeg een update.

De hele dataset van de monitoring van Vlaamse Veerkracht is ontsloten op het [Opendataportaal](#) van de Vlaamse overheid. Voorts is het ook mogelijk om analyses te doen via een publieke POWER BI, beschikbaar via de site van Vlaamse Veerkracht.

4. GOVERNANCE

Zoals ook al aangegeven bij vorige meting, is de governance van Vlaamse Veerkracht met de nieuwe regeerperiode een stuk slanker geworden. De rapporten werden ingevoerd door de projectverantwoordelijken, gevalideerd door de betrokken kabinetten, en vervolgens besproken en goedgekeurd op het Voorzitterscollege van 26 mei 2025.

5. BIJLAGEN

BIJLAGE 1: Monitoring Relanceplan Vlaamse Veerkracht: globaal voortgangsrapport meetmoment 31 december 2024

BIJLAGE 2: Monitoring Relanceplan Vlaamse Veerkracht: factsheet meetmoment 31 december 2024

Matthias Diependaele

Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie en Industrie,
Buitenlandse Zaken, Digitalisering en Facilitair Management
